



FYSIEKE SCHOUW T.05935

MA TBB E Alber 6 Gravendijk

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 5.1.2e
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

Datum: 06-02-2023
Locatie: Gravendijk6

Verslaglegger: 5.1.2e
Telefoon:
E-mail: 5.1.2e@enexis.nl

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon
5.1.2e	+316 5.1.2e

Overige betrokkenen

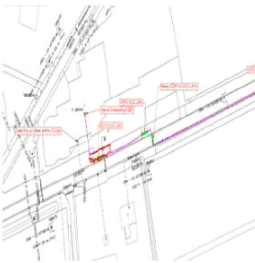
Naam	Functie	Bedrijf
5.1.2e		gemeente

Ploegdagen

van	week	tot	week	ploegdagen	discipline
20-02-2023	8	27-02-2023	9	8	Elektra

Afspraken

06-02-2023	- strook 17 cm ex ov laten leveren bij Enexis. - VM voor MSR zie foto 1 - 3 KV opruimen (ander project) -2 proefsleuven voor persing bij de MSR. - eenrichtingsverkeer gravendijk. - eventueel langs de gravendijk diverse grasbetonblokken eruit. - tekening aanpassen zie foto 2 - week 10 montage installateur (legtenberg) - bij geen tegenslag 8 ploegdagen. - de aannemer stuurt een brief naar omwonende. - COA vermeld de werkzaamheden in de nieuwsbrief. - 21 februari start aannemer. - grootmateriaal hoogeveen. - kleinmateriaal op locatie.
------------	---

	
06-02-2023	

Definitieve werkomschrijving

Aanleg nieuwe laagspanningskabel 4x240AL vanuit station TBB.581052, tbv GV 3x250A aansluiting voor adres : Gravendijk 6 te Albergen
e.e.a. conform plantekening.

Let op omgevingsfactoren in de buurt.

Projectgebonden Risico's

--

V&G Plan

Aanmaakdatum: Wed Feb 01 10:36:41 UTC 2023

Opgesteld door: 5.1.2e

V&G Coördinator ontwerpfase: 5.1.2e

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd		

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse:

BUS melding: Geen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	diverse data partijen	Nee	Nee
	Locatie		
	Volledig tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
2	Coteq Netbeheer B.V.	Nee	Ja
	Locatie		

V&G Plan

Even zijde van Gravendijk			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van hoge druk gasleidingen			
Maatregel			
Het afschermen/beschermen van een kabel of leiding			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
3	Coteq Netbeheer B.V.	Nee	Nee
Locatie			
volledig tracé			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van < Ø 250 mm lage druk gasleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
4	Enexis LS	Nee	Nee
Locatie			
Volledig tracé			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van kunststof LS-kabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
5	Enexis MS	Nee	Ja
	Locatie		
	Rondom station		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) MS-kabels		
	Maatregel		
	Het afschermen/beschermen van een kabel of leiding		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
6	Vitens	Nee	Nee
	Locatie		
	Gravendijk		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (< Ø 200 mm)		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
7	Gemeente Dinkelland	Nee	Nee
	Locatie		
	Even zijde van de weg		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie.		



V&G Plan

	Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.
CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)	



Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Ja

Gemaakte afspraken Voeg maatregel toe of pas bestaande aan door op het risico te klikken



Aanvraag in behandeling

Verontreinigde bodem

Chroom-6 Inventarisatie

Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?

Ja

Worden de volgende activiteiten uitgevoerd op/aan een asset met een verf- of coatinglaag o.a. LS/MS installaties, transformatoren, rekken, kasten, ombouwen, panelen, meteropstellingen, hekken, deuren, ramen en kozijnen:

- Machinaal schuren (zonder on-tool afzuiging);
- Slijpen met afbraam- of lamellenschijf;
- Hogedruk water- of gridstralen;
- Lassen, snijbranden, heetstoken of lassen op RVS.

Nee

Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Nee

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Nee

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Nee

Moet de weg worden afgesloten?

Nee

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Ja

Voorschouw omgeving

Leg de geconstanteerde punten vast





Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Ja

Aanvullende afspraken met betrekking tot tracé afwijkingen

Geef hieronder aanvullende afspraken in

- daar waar de persing wordt gemaakt oversteek MSR.



Asbest

TBB.581052 status: Asbest Geel



Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Opmerkingen mbt het verslag

Aanwezig;
gemeente Tubbergen
COA
Legtenberg elektrotechniek
VSH
Enexis.
